
Rider Service — Status del Proyecto

Viernes 30 de octubre de 2026 · Entrega: lunes 2 de noviembre de 2026

Resumen

Estado general: AMARILLO. El 77 % de los requisitos MUST está terminado (72 de 93): la autenticación con correo, la solicitud con GPS, la asignación, la máquina de estados y el seguimiento en tiempo real ya funcionan con Supabase. Lo que falta es acotado, pero incluye el núcleo del modelo de negocio: **el monto final, el pago simulado con comisión y el inicio de sesión con Google** siguen pendientes y son MUST. Si esos tres bloques se cierran el sábado 31/10, la entrega llega en verde.

Indicador	Valor	Semáforo
Requisitos MUST terminados	72 de 93 (77 %)	Amarillo
Requisitos MUST parciales	8	Amarillo
Requisitos MUST sin empezar	13	Rojo (concentrados en pago y Google)
Requisitos SHOULD terminados	7 de 14 (50 %)	Amarillo
Recorridos MUST verificables hoy	5 de 8 (1, 3, 4, 8 y 9)	Amarillo
Tarjetas en Trello: To Do / Doing / Done	16 / 0 / 22	—
Casos de test definidos	186 (156 MUST), sin ejecutar	—

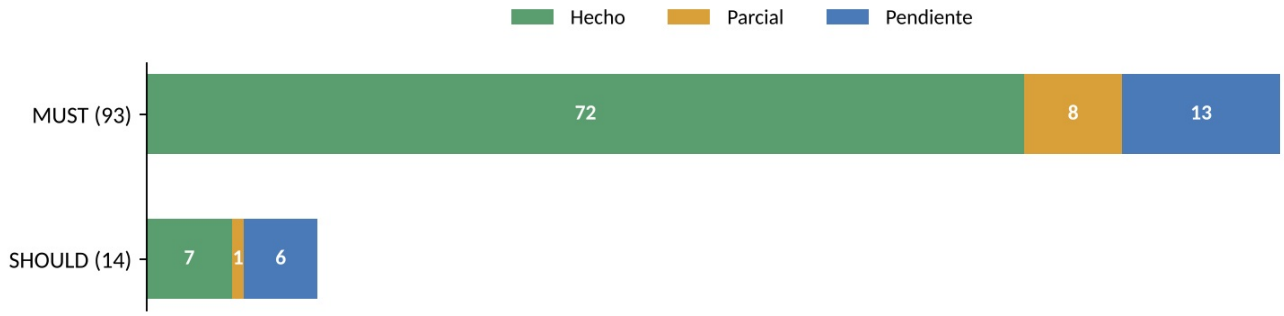

Avance por módulo

Módulo	Estado	Hecho	Falta
Autenticación y sesión	Amarillo	Login y registro reales, rol con efecto, sesión persistente, RLS	Google (RF-AUTH-007, RN-015) y confirmación de cierre (RF-AUTH-005)
Perfil	Amarillo	Datos reales, edición de nombre y teléfono, foto en Storage	Estadísticas reales (RF-VIEW-005)
Solicitud de asistencia	Amarillo	4 pasos con validación, GPS, código RS, cancelación con motivo	Botón Atrás de Android (RF-VIEW-006)
Asignación y estados	Amarillo	Bandeja Disponibles, aceptar con ETA, transiciones validadas, bitácora	Finalizar con monto (RF-STATE-005, RF-QUOTE-001, RN-014)
Seguimiento	Verde	Línea de tiempo en tiempo real, contacto, historial	Mostrar monto y estado de pago (RF-QUOTE-002, RF-PAY-003)
Pago y comisión	Rojo	Diseño en la SRS (tabla `pagos`, `registrar_pago`)	Todo: RF-PAY-001 a 003, RF-VIEW-014, RN-007, RN-012, RN-013, RNF-SEC-005
Datos, archivos y seguridad	Verde	PostgreSQL, RLS en todas las tablas, Storage, migraciones versionadas	—
No funcionales	Amarillo	Rendimiento, compatibilidad Android, robustez, TypeScript estricto	Quitar hex (RNF-UX-001), seed de mecánicos (RNF-TEST-002), README (RNF-MAIN-006)

Pantallas SHOULD	Pendiente	—	Mapa, detalle de mecánico, Mis ganancias, disponibilidad

Logros desde la Entrega 1

- Migración completa de los datos JSON a Supabase tocando solo `/services`, como preveía la arquitectura (RNF-SCAL-001).
- Autenticación real con Supabase Auth y control de acceso por rol reforzado con RLS.
- Flujo completo del cliente: SOS, solicitud con GPS, confirmación, seguimiento en tiempo real y cancelación.
- Flujo del mecánico: bandeja de disponibles, aceptación atómica con ETA y avance de estados con bitácora.
- Perfil editable con foto en Storage.
- SRS con modelo de negocio (comisión del 10 %), estados de implementación y alcance cerrado.
- Tablero de Trello reorganizado y Plan de Testing con 186 casos.

Pendientes y responsables

Tarjeta	Trabajo	Prior.	Responsable	Fecha
B01	Monto final al finalizar el servicio	MUST	Agustín Russo, Amir Gramajo	Vie 30/10
B02	Tabla `pagos` y `registrar_pago` con comisión	MUST	Agustín Russo, Lucas González	Vie 30 – Sáb 31/10
P10	Pantalla de pago simulado	MUST	Casandra Godoy	Sáb 31/10
P11	Monto y estado de pago visibles	MUST	Casandra Godoy	Dom 1/11
A01	Inicio de sesión con Google	MUST	Lucas González, Thiago Ferreyra	Vie 30 – Sáb 31/10
F01	Estadísticas reales del perfil	MUST	Thiago Ferreyra	Vie 30/10
F02	Botón Atrás en la solicitud	MUST	Donato Díaz Cardozo	Vie 30/10
F03	Confirmación al cerrar sesión	MUST	Casandra Godoy	Vie 30/10
Q01	Quitar colores hex de los componentes	MUST	Víctor Aguilera	Vie 30 – Sáb 31/10
Q02	Seed con más mecánicos de ejemplo	MUST	Thiago Ferreyra	Vie 30/10
Q03	README completo y uso de IA	MUST	Leo Franco	Sáb 31/10 – Dom 1/11
P08	Mecánicos cerca tuyo (mapa)	SHOULD	Donato Díaz Cardozo	Sáb 31/10 – Dom 1/11
P12	Detalle de mecánico	SHOULD	Thiago Ferreyra	Sáb 31/10 – Dom 1/11
P13	Mis ganancias del mecánico	SHOULD	Amir Gramajo	Sáb 31/10 – Dom 1/11
F04	Disponibilidad del mecánico	SHOULD	Lucas González	Dom 1/11
V01	Verificación final y regresión	MUST	Víctor Aguilera, Leo Franco	Sáb 31/10 – Dom 1/11

Riesgos y bloqueos

Riesgo	Impacto	Acción	Responsable
El pago (B01, B02, P10, P11) no llega a tiempo	Alto: es MUST y es el modelo de negocio	Priorizarlo sobre todos los SHOULD; probar `registrar_pago` por script antes de hacer la pantalla	Agustín Russo
Google OAuth falla en Expo Go por la URL de retorno	Alto: recorrido 2 MUST	Configurar el proveedor y probar CP-GOO-06 el viernes	Lucas González
Dependencias en cadena: P10 y P11 esperan a B02	Medio	B02 listo el sábado a la mañana; P10 arranca con datos simulados	Agustín Galeano (SM)
Varias personas con más de una tarea el sábado	Medio	Los SHOULD solo empiezan con los MUST propios en verde	Agustín Galeano (SM)

Los casos de test todavía no se ejecutaron	Alto: el criterio de salida exige 100 % de los MUST	Pasada completa el sábado y regresión el domingo	Víctor Aguilera, Leo Franco

Decisiones y próximos pasos

1. **Prioridad estricta:** pago y Google antes que cualquier pantalla SHOULD. Si el domingo al mediodía algún MUST sigue abierto, los SHOULD se congelan.
2. **Seguimiento por el tablero de Trello y el chat del equipo** para desbloquear dependencias (coordina Agustín Galeano).
3. **Congelamiento de código** el domingo 1/11 a las 20 h; después solo entran correcciones de defectos Críticos o Altos.
4. **Aprobación de la entrega** por Joaquín Stachioni con la tarjeta V01 cerrada y el informe final de QA.
